


検査記録表

工事名	サンプル工事	所長	総括監督員	主任監督員	監督員
工事箇所	長野県飯山市				
工種	舗装工				
種別	アスファルト舗装工	主任技術者	ワイズ太郎 印		

検測位置図

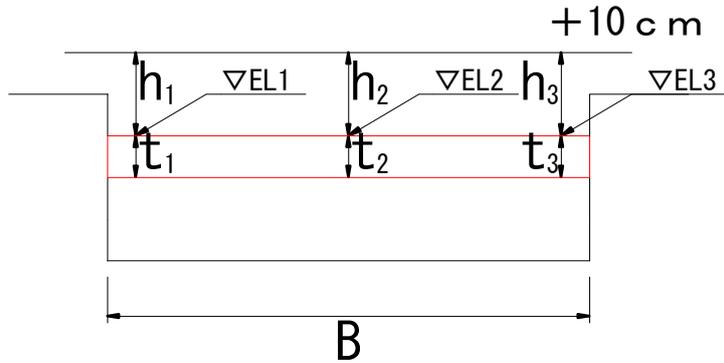

管理基準			
項目		-	+
基準高	EL (mm)	-40	+40
厚さ	t (mm)	-25	
幅	B (mm)	-50	
深さ	h (mm)	-40	+40
社内管理			
基準高	EL (mm)	-20	+20
厚さ	t (mm)	-13	
幅	B (mm)	-25	
深さ	h (mm)	-20	+20

検測区分 (いずれかに○) **・段階確認** ・出来形管理(確認段階以外) ・その他()

測点	設計	検測	誤差	日付	判定	測点	設計	検測	誤差	日付	判定
No. 0						No. 1					
基準高 EL1	100.000	99.990	-0.010	8/1		基準高 EL1	110.000	110.020	0.020	8/2	
基準高 EL2	100.000	99.990	-0.010			基準高 EL2	110.000	110.020	0.020		
基準高 EL3	100.000	99.990	-0.010			基準高 EL3	110.000	110.020	0.020		
厚さ t1	20	21	1			厚さ t1	20	22	2		
厚さ t2	20	21	1			厚さ t2	20	22	2		
厚さ t3	20	21	1			厚さ t3	20	22	2		
幅 B	5.000	5.025	0.025			幅 B	5.000	5.035	0.035		
深さ h1	500	505	5			深さ h1	500	510	10		
深さ h2	500	505	5			深さ h2	500	510	10		
深さ h3	500	505	5			深さ h3	500	510	10		

日付欄は受注者が確認した日付を記入。判定欄は監督員が確認した日付を自署し、サインまたは押印により証する。

