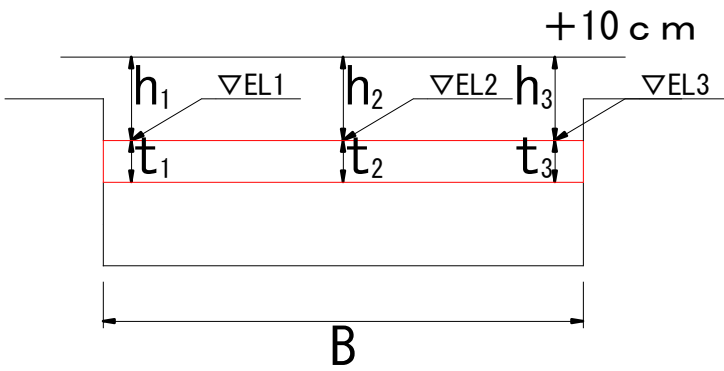


検査記録表

工 事 名		サンプル工事				所長	総括監督員	主任監督員	監督員		
工事箇所		長野県飯山市									
工 種		舗装工									
種 別		アスファルト舗装工				主任技術者	ワイズ太郎 印				
検 測 位 置 図						管理基準					
						項 目		－	＋		
						基準高	EL (mm)	-40	+40		
						厚さ	t (mm)	-25			
						幅	B (mm)	-50			
						深さ	h (mm)	-40	+40		
						社内管理					
						基準高	EL (mm)	-20	+20		
						厚さ	t (mm)	-13			
						幅	B (mm)	-25			
深さ	h (mm)	-20	+20								
検測区分		(いずれかに○) ・ 段階確認 ・ 出来形管理(確認段階以外) ・ その他()									
測点	設計	検測	誤差	日付	判定	測点	設計	検測	誤差	日付	判定
No. 0						No. 1					
基準高 EL1	100.000	99.990	-0.010	8/1		基準高 EL1	110.000	110.020	0.020	8/2	
基準高 EL2	100.000	99.990	-0.010			基準高 EL2	110.000	110.020	0.020		
基準高 EL3	100.000	99.990	-0.010			基準高 EL3	110.000	110.020	0.020		
厚さ t1	20	21	1			厚さ t1	20	22	2		
厚さ t2	20	21	1			厚さ t2	20	22	2		
厚さ t3	20	21	1			厚さ t3	20	22	2		
幅 B	5.000	5.025	0.025			幅 B	5.000	5.035	0.035		
深さ h1	500	505	5			深さ h1	500	510	10		
深さ h2	500	505	5			深さ h2	500	510	10		
深さ h3	500	505	5			深さ h3	500	510	10		

日付欄は受注者が確認した日付を記入。判定欄は監督員が確認した日付を自署し、サインまたは押印により証する。

検査記録票

工 事 名		サンプル工事					所長	課長	係長	監督員	
工事箇所		長野県飯山市									
工 種		舗装工									
種 別		アスファルト舗装工					主任技術者	ワイズ太郎 印			
検 測 位 置 図							管理基準				
							項 目		-mm	+mm	
							基準高	EL (mm)	-40	+40	
							厚さ	t (mm)	-25		
							幅	B (mm)	-50		
							深さ	h (mm)	-40	+40	
							社内管理				
							基準高	EL (mm)	-20	+20	
							厚さ	t (mm)	-13		
							幅	B (mm)	-25		
深さ	h (mm)	-20	+20								

測点	設計	検測	誤差	日付	判定	測点	設計	検測	誤差	日付	判定
No. 0						No. 1					
基準高 EL1	100.000	99.990	-0.010	8/1		基準高 EL1	110.000	110.020	0.020	8/2	
基準高 EL2	100.000	99.990	-0.010			基準高 EL2	110.000	110.020	0.020		
基準高 EL3	100.000	99.990	-0.010			基準高 EL3	110.000	110.020	0.020		
厚さ t1	20	21	1			厚さ t1	20	22	2		
厚さ t2	20	21	1			厚さ t2	20	22	2		
厚さ t3	20	21	1			厚さ t3	20	22	2		
幅 B	5.000	5.025	0.025			幅 B	5.000	5.035	0.035		
深さ h1	500	505	5			深さ h1	500	510	10		
深さ h2	500	505	5			深さ h2	500	510	10		
深さ h3	500	505	5			深さ h3	500	510	10		

※ 判定欄は監督員の確認月日、サイン又は印とする。
