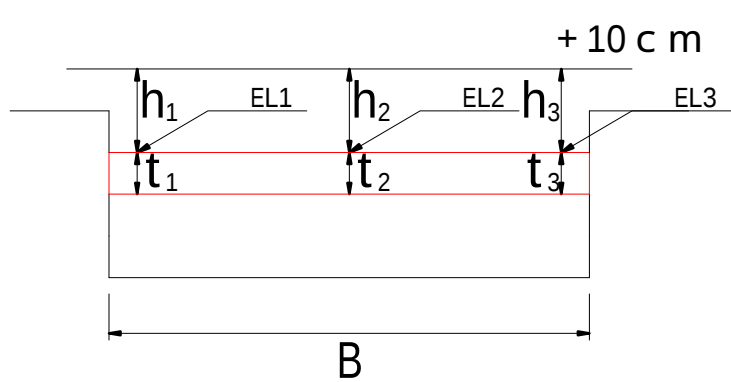


検査記録票

工 事 名		サンプル工事				所長	課長	係長	監督員		
工事箇所		長野県飯山市									
工 種		舗装工									
種 別		アスファルト舗装工				主任技術者		ワイズ太郎		印	
検 測 位 置 図						管理基準					
						項 目		-mm	+mm		
						基準高	EL1	-40	+40		
						基準高	EL2	-40	+40		
						基準高	EL3	-40	+40		
						厚さ	t1	-25			
						厚さ	t2	-25			
						厚さ	t3	-25			
						幅	B	-50			
						深さ	h1	-40	+40		
測点	設計	検測	誤差	日付	判定	測点	設計	検測	誤差	日付	判定
No.0						No.1					
基準高 EL1	100.000	99.990	-0.010			基準高 EL1	110.000	110.020	0.020		
基準高 EL2	100.000	99.990	-0.010			基準高 EL2	110.000	110.020	0.020		
基準高 EL3	100.000	99.990	-0.010			基準高 EL3	110.000	110.020	0.020		
厚さ t1	20	21	1			厚さ t1	20	22	2		
厚さ t2	20	21	1			厚さ t2	20	22	2		
厚さ t3	20	21	1			厚さ t3	20	22	2		
幅 B	5.000	5.025	0.025			幅 B	5.000	5.035	0.035		
深さ h1	500	505	5			深さ h1	500	510	10		
深さ h2	500	505	5			深さ h2	500	510	10		
深さ h3	500	505	5			深さ h3	500	510	10		

判定欄は監督員の確認月日、サイン又は印とする。
