


## 出来形管理図（工程能力図）

工種 舗装工

種別 アスファルト舗装工

測定者 ワイズ太郎

印

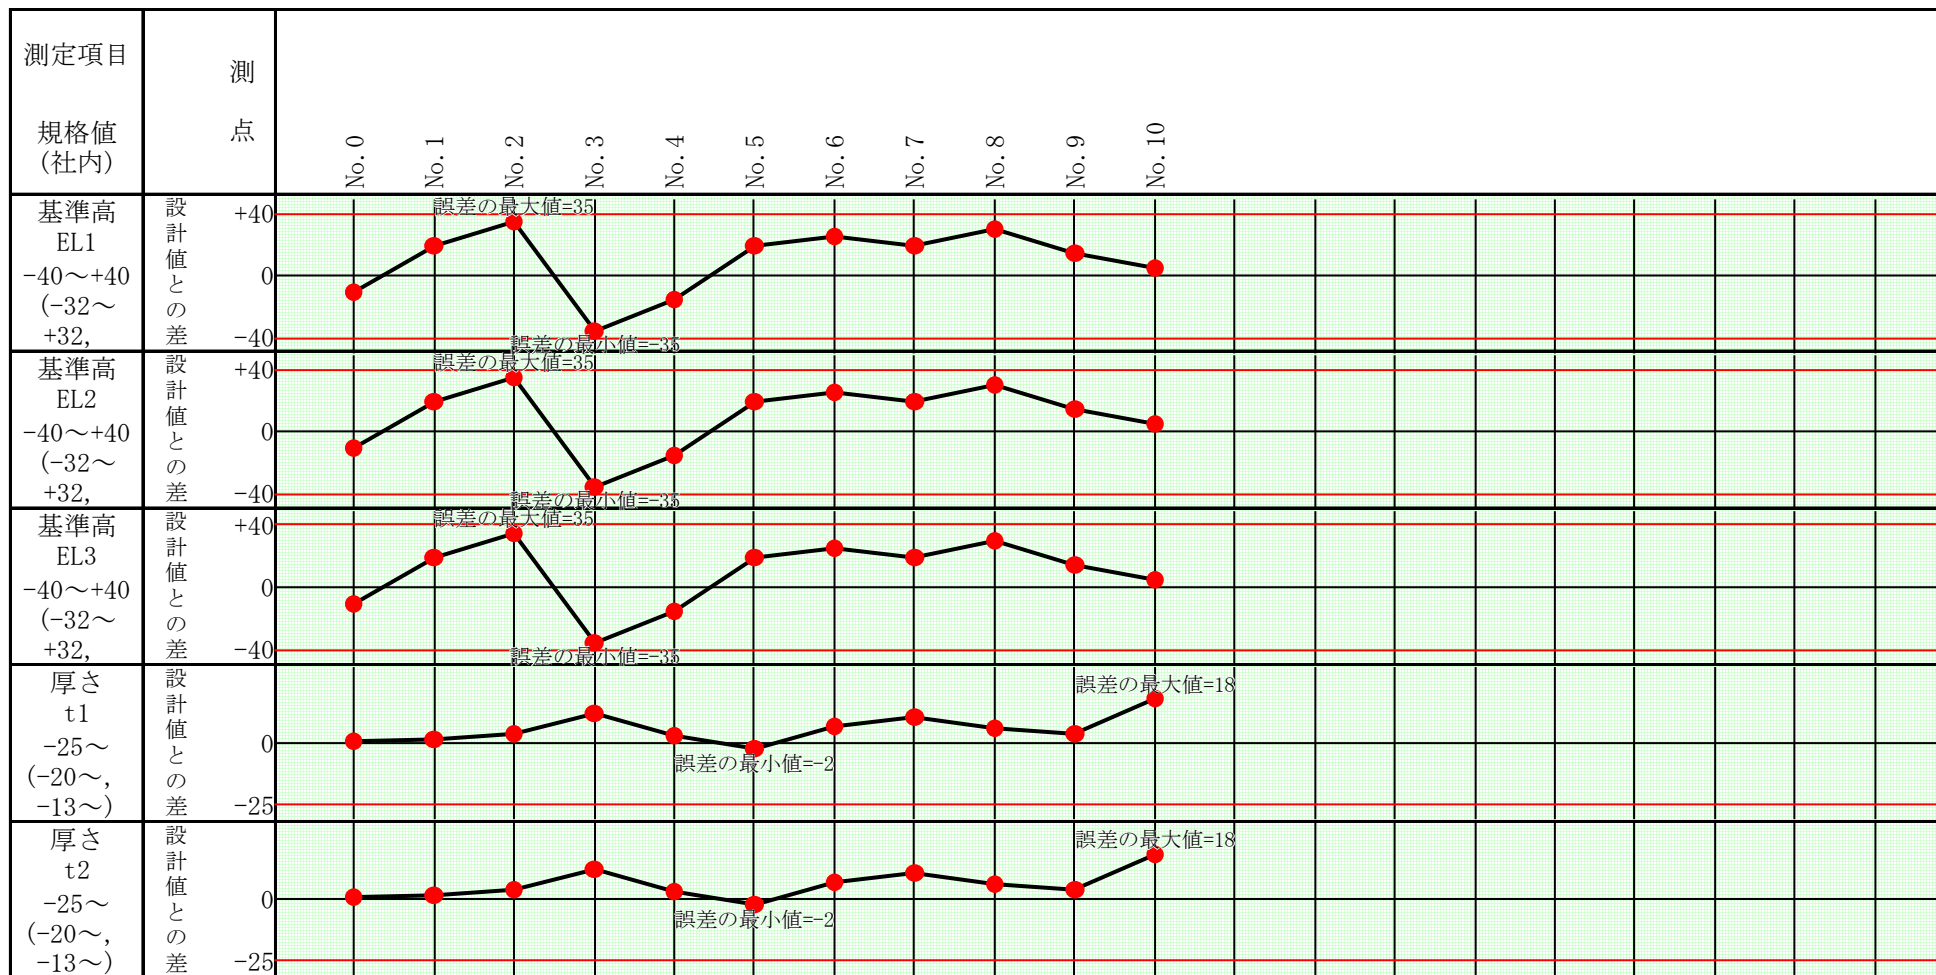



# 測定結果一覧表

工事名 サンプル工事

工種 舗装工


種別 アスファルト舗装工

測定者 ワイズ太郎

印

測定項目	基準高 EL1			基準高 EL2			基準高 EL3			厚さ t1		
規格値	-40~+40 mm			-40~+40 mm			-40~+40 mm			-25~ mm		
社内規格値	-32~+32 mm			-32~+32 mm			-32~+32 mm			-20~ mm		
社内目標値	-20~+20 mm			-20~+20 mm			-20~+20 mm			-13~ mm		
測点又は区別	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差
No. 0	100.000 <sup>m</sup>	99.990 <sup>m</sup>	-0.010 <sup>m</sup>	100.000 <sup>m</sup>	99.990 <sup>m</sup>	-0.010 <sup>m</sup>	100.000 <sup>m</sup>	99.990 <sup>m</sup>	-0.010 <sup>m</sup>	20 <sup>mm</sup>	21 <sup>mm</sup>	1 <sup>mm</sup>
No. 1	110.000	110.020	0.020	110.000	110.020	0.020	110.000	110.020	0.020	20	22	2
No. 2	120.000	120.035	0.035	120.000	120.035	0.035	120.000	120.035	0.035	20	24	4
No. 3	130.000	129.965	-0.035	130.000	129.965	-0.035	130.000	129.965	-0.035	20	32	12
No. 4	140.000	139.985	-0.015	140.000	139.985	-0.015	140.000	139.985	-0.015	20	23	3
No. 5	150.000	150.020	0.020	150.000	150.020	0.020	150.000	150.020	0.020	20	18	-2
No. 6	160.000	160.025	0.025	160.000	160.025	0.025	160.000	160.025	0.025	20	27	7
No. 7	170.000	170.020	0.020	170.000	170.020	0.020	170.000	170.020	0.020	20	31	11
No. 8	180.000	180.030	0.030	180.000	180.030	0.030	180.000	180.030	0.030	20	26	6
No. 9	190.000	190.015	0.015	190.000	190.015	0.015	190.000	190.015	0.015	20	24	4
測定項目	基準高 EL1			基準高 EL2			基準高 EL3			厚さ t1		
規格値	-40~+40 mm			-40~+40 mm			-40~+40 mm			-25~ mm		
社内規格値	-32~+32 mm			-32~+32 mm			-32~+32 mm			-20~ mm		
社内目標値	-20~+20 mm			-20~+20 mm			-20~+20 mm			-13~ mm		
測点又は区別	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差
No. 10	200.000 <sup>m</sup>	200.005 <sup>m</sup>	0.005 <sup>m</sup>	200.000 <sup>m</sup>	200.005 <sup>m</sup>	0.005 <sup>m</sup>	200.000 <sup>m</sup>	200.005 <sup>m</sup>	0.005 <sup>m</sup>	20 <sup>mm</sup>	38 <sup>mm</sup>	18 <sup>mm</sup>

略図

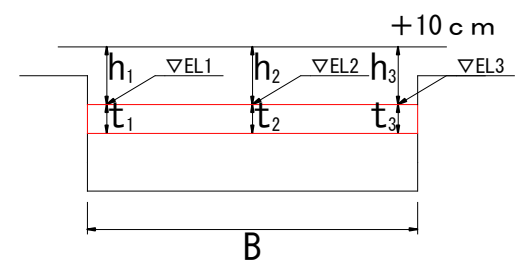



基準高 EL1  
-40~+40(-32~+32, -20~+20) mm

測定者氏名 ワイズ太郎

印

