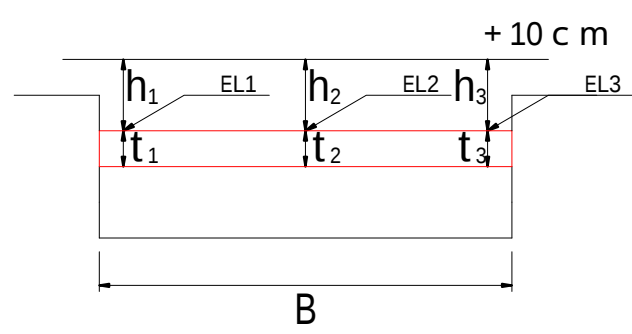


測 定 結 果 表

工 事 件 名	サンプル工事	工 種	舗装工	現場代理人	ワイズ 太郎 印
		測定頻度		測 定 者	ワイズ 太郎 印

測 定 箇 所	測 定 月 日	設計値 (m)	実測値 (m)	差 (m)	規格値 [社内] (mm)	摘 要
基準高EL1 No.0	8/1	100.000	99.990	-0.010	-40 ~ +40 [-20 ~ +20]	
No.1	8/2	110.000	110.020	0.020	-40 ~ +40 [-20 ~ +20]	
No.2	8/2	120.000	120.035	0.035	-40 ~ +40 [-20 ~ +20]	
No.3	8/3	130.000	129.965	-0.035	-40 ~ +40 [-20 ~ +20]	
No.4	8/3	140.000	139.985	-0.015	-40 ~ +40 [-20 ~ +20]	
No.5	8/4	150.000	150.020	0.020	-40 ~ +40 [-20 ~ +20]	
No.6	8/4	160.000	160.025	0.025	-40 ~ +40 [-20 ~ +20]	
No.7	8/5	170.000	170.020	0.020	-40 ~ +40 [-20 ~ +20]	
記 事						
