

様式 (2)

サンプル工事

舗装工


工程能力図

請負者 ワイズ建設

基準高EL1

-40.0~+40.0(-20.0~+20.0) mm

測定者 ワイズ 太郎

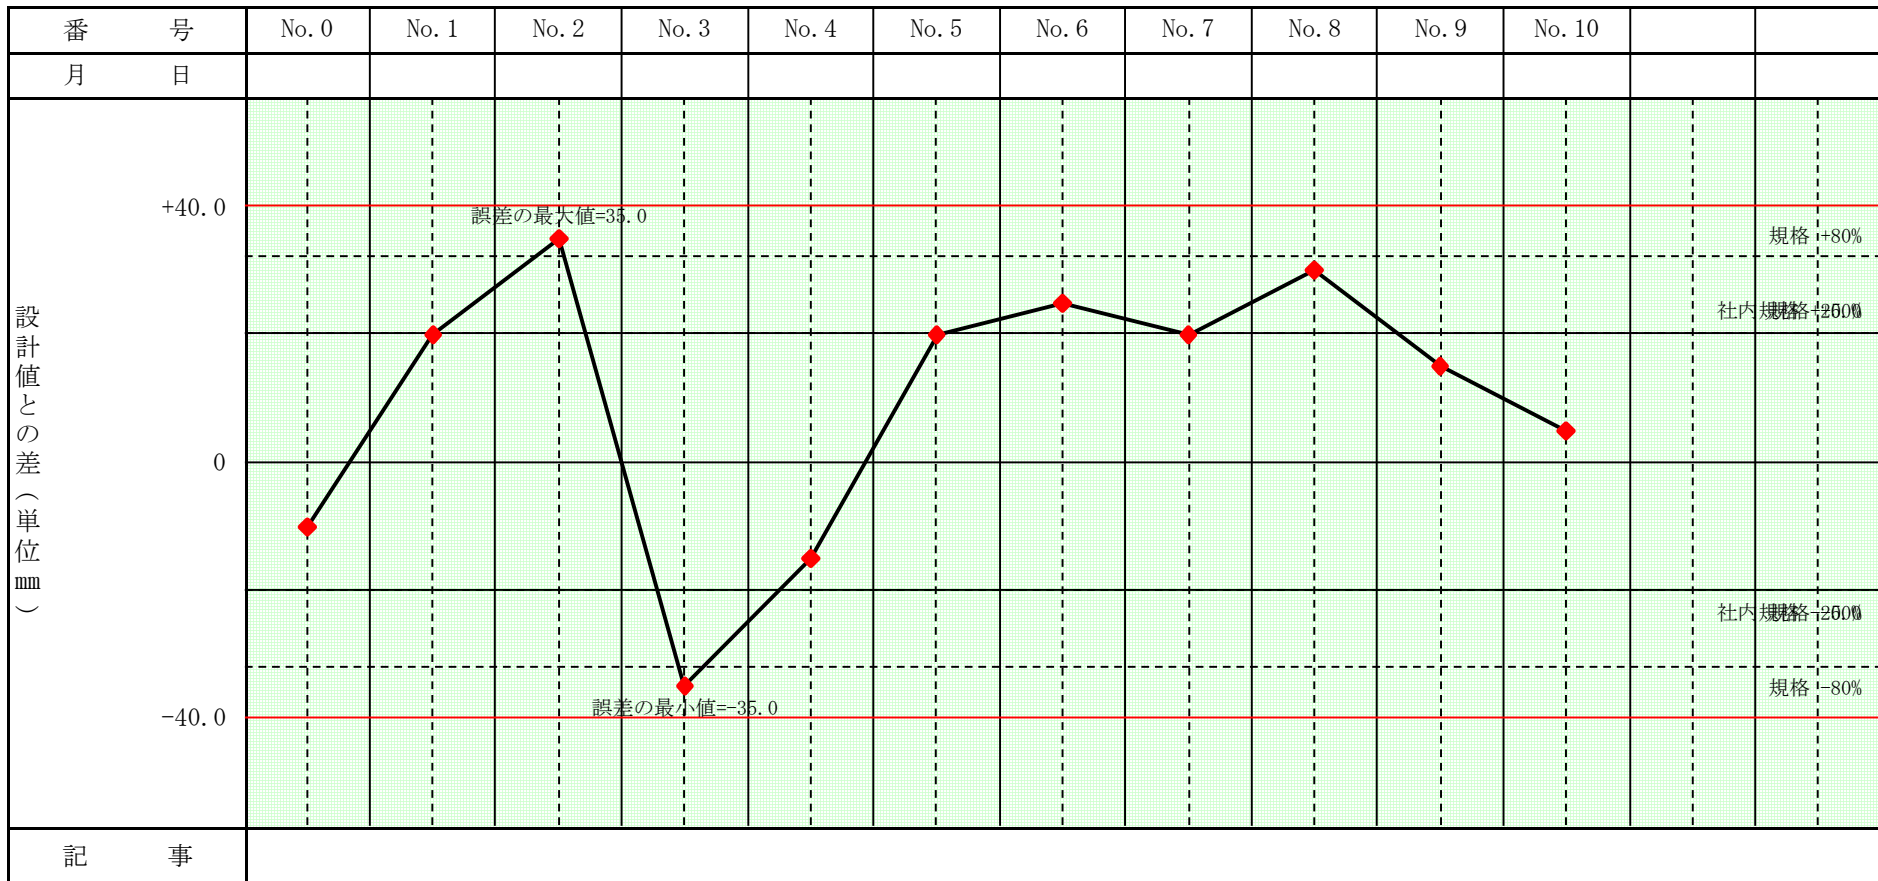

- 注 1. 工事名は、土工、路盤工、側溝工、のり覆工、のり留工等記入する。
2. 標題は、厚管理図表、基準高管理図表、のり長管理図表等を記入する。
3. 番号は、あらかじめ測点を定め、起点から終点に向って順序に記入しておく。
4. 月日欄は、当該測点実測の月日を記入する。
5. 設計量との差の単位を定め、目盛に数値を記入する。
6. 図表に許容範囲の線を朱書で記入する。
7. 記事は、手直の処置等を記入承諾印を押

様式 (3)

サンプル工事

舗装工

基準高EL1

測定結果一覧表

請負者 ワイズ建設

測定者 ワイズ太郎

測 点	設 計 値 (A)	実 測 値 (B)	設計値との差 (C)=(B)-(A)	規 格 値(社内) (D)	規格値との差 (E)=(B)-(D)	摘 要
No.0	100.000	99.990	-0.010	-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		
No.1	110.000	110.020	0.020	-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		
No.2	120.000	120.035	0.035	-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		
No.3	130.000	129.965	-0.035	-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		
No.4	140.000	139.985	-0.015	-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		
No.5	150.000	150.020	0.020	-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		
No.6	160.000	160.025	0.025	-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		
No.7	170.000	170.020	0.020	-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		
No.8	180.000	180.030	0.030	-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		
No.9	190.000	190.015	0.015	-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		
No.10	200.000	200.005	0.005	-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		

〔注〕 (イ) 出来形の場合は(E)欄には記入する必要はない。  
 (ロ) 品質の場合は必要と思われる欄のみ記入し、他は空欄とする。

