様式管－３

測定結果一覧表

工事名 サンプル工事

工　種 舗装工

種　別 アスファルト舗装工

主任技術者 ワイズ太郎　　印

測　定　者 ワイズ太郎　　印

測定項目	基準高　EL1			基準高　EL2			基準高　EL3			厚さ　t1		
規 格 値(社内)	-40～+40(-20～+20) mm			-40～+40(-20～+20) mm			-40～+40(-20～+20) mm			-25～(-13～) mm		
測点又は区別	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差
	m	m	m	m	m	m	m	m	m	mm	mm	mm
No.0	100.000	99.990	-0.010	100.000	99.990	-0.010	100.000	99.990	-0.010	20	21	1
No.1	110.000	110.020	0.020	110.000	110.020	0.020	110.000	110.020	0.020	20	22	2
No.2	120.000	120.035	0.035	120.000	120.035	0.035	120.000	120.035	0.035	20	24	4
No.3	130.000	129.965	-0.035	130.000	129.965	-0.035	130.000	129.965	-0.035	20	32	12
No.4	140.000	139.985	-0.015	140.000	139.985	-0.015	140.000	139.985	-0.015	20	23	3
No.5	150.000	150.020	0.020	150.000	150.020	0.020	150.000	150.020	0.020	20	18	-2
No.6	160.000	160.025	0.025	160.000	160.025	0.025	160.000	160.025	0.025	20	27	7
No.7	170.000	170.020	0.020	170.000	170.020	0.020	170.000	170.020	0.020	20	31	11
No.8	180.000	180.030	0.030	180.000	180.030	0.030	180.000	180.030	0.030	20	26	6
No.9	190.000	190.015	0.015	190.000	190.015	0.015	190.000	190.015	0.015	20	24	4
測定項目	基準高　EL1			基準高　EL2			基準高　EL3			厚さ　t1		
規 格 値(社内)	-40～+40(-20～+20) mm			-40～+40(-20～+20) mm			-40～+40(-20～+20) mm			-25～(-13～) mm		
測点又は区別	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差
	m	m	m	m	m	m	m	m	m	mm	mm	mm
No.10	200.000	200.005	0.005	200.000	200.005	0.005	200.000	200.005	0.005	20	38	18
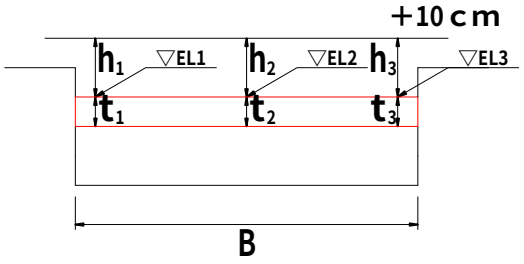
略　　図
